
Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger
1	**Bauabschnitt 1**	**94 Tage?**	**Mon 20.09.21**	**Fre 11.03.22**		
2	Baustelleneinrichtung	2 Tage	Mon 20.09.21	Die 21.09.21		3;4;5
3	Rückbau Architektur	15 Tage	Mit 22.09.21	Die 12.10.21	2	6;7;8;9
4	Rückbau Sanitär	5 Tage	Mit 22.09.21	Die 28.09.21	2	
5	Rückbau Elektro	3 Tage	Mit 22.09.21	Fre 24.09.21	2	
6	Betonarbeiten	5 Tage	Mit 13.10.21	Die 19.10.21	3	
7	Kernbohrungen	4 Tage	Mit 13.10.21	Mon 18.10.21	3	
8	Trockenbau Raumteilung	8 Tage	Mit 13.10.21	Fre 22.10.21	3	
9	Fensterbau	3 Tage	Mit 13.10.21	Fre 15.10.21	3	10
10	Rohbau Sanitär	69 Tage	Mon 18.10.21	Fre 04.02.22	9	12
11	Rohbau Elektro	5 Tage	Mon 31.01.22	Fre 04.02.22		17
12	Dachabdichtung	2 Tage	Mon 07.03.22	Die 08.03.22	10	
13	Einbau Dämmung	17 Tage	Don 20.01.22	Fre 11.03.22		
14	Einbau Brandschutz	2 Tage	Don 03.02.22	Fre 04.02.22		15
15	RLT-Netz	15 Tage	Mon 07.03.22	Fre 25.03.22	14	
16	Estricharbeiten	8 Tage	Mon 28.03.22	Mit 06.04.22	18	
17	Putz und Wandausgleich	10 Tage	Mon 07.03.22	Fre 18.03.22	11	
18	Trockenbau	15 Tage	Mon 07.03.22	Fre 25.03.22		19;20;16
19	Bauwerksabdichtung	10 Tage	Mon 28.03.22	Fre 08.04.22	18	
20	Fliesenarbeiten	20 Tage	Mon 28.03.22	Fre 22.04.22	18	21;22;23;24
21	Einrichtung und Ausstattur	2 Tage	Mon 25.04.22	Die 26.04.22	20	
22	Fertiginstallation Sanitär	4 Tage	Mon 25.04.22	Don 28.04.22	20	
23	Fertiginstallation Elektro	3 Tage	Mon 25.04.22	Mit 27.04.22	20	
24	Bauabschlussreinigung	2 Tage	Mon 25.04.22	Die 26.04.22	20	26
25	**Bauabschnitt 2**	**89 Tage**	**Mit 27.04.22**	**Mon 29.08.22**		
26	Baustelleneinrichtung	2 Tage	Mit 27.04.22	Don 28.04.22	24	27;28;29
27	Rückbau Architektur	15 Tage	Fre 29.04.22	Don 19.05.22	26	30;31;32;33;51;50
28	Rückbau Sanitär	5 Tage	Fre 29.04.22	Don 05.05.22	26	
29	Rückbau Elektro	3 Tage	Fre 29.04.22	Die 03.05.22	26	
30	Betonarbeiten	5 Tage	Fre 20.05.22	Don 26.05.22	27	
31	Kernbohrungen	4 Tage	Fre 20.05.22	Mit 25.05.22	27	
32	Trockenbau Raumteilung	6 Tage	Fre 20.05.22	Fre 27.05.22	27	
33	Fensterbau	3 Tage	Fre 20.05.22	Die 24.05.22	27	34;35
34	Rohbau Sanitär	15 Tage	Mit 25.05.22	Die 14.06.22	33	36
35	Rohbau Elektro	5 Tage	Mit 25.05.22	Die 31.05.22	33	
36	Dachabdichtung	2 Tage	Mit 15.06.22	Don 16.06.22	34	37;38
37	Einbau Dämmung	5 Tage	Fre 17.06.22	Don 23.06.22	36	
38	Einbau Brandschutz	2 Tage	Fre 17.06.22	Mon 20.06.22	36	39
39	Estricharbeiten	7 Tage	Die 21.06.22	Mit 29.06.22	38	40
40	Trockenzeit Estrich	5 Tage	Don 30.06.22	Mit 06.07.22	39	41;42
41	Putz und Wandausgleich	5 Tage	Don 07.07.22	Mit 13.07.22	40	43
42	Trockenbau	10 Tage	Don 07.07.22	Mit 20.07.22	40	
43	Bauwerksabdichtung	10 Tage	Don 14.07.22	Mit 27.07.22	41	44
44	Fliesenarbeiten	18 Tage	Don 28.07.22	Mon 22.08.22	43	45;46;48;47
45	Einrichtung und Ausstattur	5 Tage	Die 23.08.22	Mon 29.08.22	44	
46	Fertiginstallation Sanitär	4 Tage	Die 23.08.22	Fre 26.08.22	44	
47	Fertiginstallation Elektro	3 Tage	Die 23.08.22	Don 25.08.22	44	
48	Bauabschlussreinigung	2 Tage	Die 23.08.22	Mit 24.08.22	44	
49	**Bauabschnitt 3**	**91 Tage**	**Fre 20.05.22**	**Fre 23.09.22**		
50	Baustelleneinrichtung	2 Tage	Fre 20.05.22	Mon 23.05.22	27	51;52;53
51	Rückbau Architektur	15 Tage	Die 24.05.22	Mon 13.06.22	27;50	54;55;56;57
52	Rückbau Sanitär	5 Tage	Die 24.05.22	Mon 30.05.22	50	
53	Rückbau Elektro	3 Tage	Die 24.05.22	Don 26.05.22	50	
54	Betonarbeiten	5 Tage	Die 14.06.22	Mon 20.06.22	51	
55	Kernbohrungen	4 Tage	Die 14.06.22	Fre 17.06.22	51	
56	Trockenbau Raumteilung	6 Tage	Die 14.06.22	Die 21.06.22	51	
57	Fensterbau	3 Tage	Die 14.06.22	Don 16.06.22	51	58;59
58	Rohbau Sanitär	15 Tage	Fre 17.06.22	Don 07.07.22	57	60
59	Rohbau Elektro	5 Tage	Fre 17.06.22	Don 23.06.22	57	
60	Dachabdichtung	2 Tage	Fre 08.07.22	Mon 11.07.22	58	61;62
61	Einbau Dämmung	5 Tage	Die 12.07.22	Mon 18.07.22	60	
62	Einbau Brandschutz	2 Tage	Die 12.07.22	Mit 13.07.22	60	63
63	Estricharbeiten	7 Tage	Don 14.07.22	Fre 22.07.22	62	64
64	Trockenzeit Estrich	5 Tage	Mon 25.07.22	Fre 29.07.22	63	65;66
65	Putz und Wandausgleich	5 Tage	Mon 01.08.22	Fre 05.08.22	64	67
66	Trockenbau	10 Tage	Mon 01.08.22	Fre 12.08.22	64	
67	Bauwerksabdichtung	10 Tage	Mon 08.08.22	Fre 19.08.22	65	68
68	Fliesenarbeiten	18 Tage	Mon 22.08.22	Mit 14.09.22	67	69;70;71
69	Einrichtung und Ausstattur	5 Tage	Don 15.09.22	Mit 21.09.22	68	72
70	Fertiginstallation Sanitär	4 Tage	Don 15.09.22	Die 20.09.22	68	
71	Fertiginstallation Elektro	3 Tage	Don 15.09.22	Mon 19.09.22	68	
72	Bauabschlussreinigung	2 Tage	Don 22.09.22	Fre 23.09.22	69	



Projekt: msproj11
Datum: Fre 28.01.22

Vorgang, Meilenstein, Projektsammelvorgang, Externer Meilenstein, Inaktiver Meilenstein, Manueller Vorgang, Manueller Sammelrollup, Nur Anfang, Stichtag, Manueller Fortschritt
Unterbrechung, Sammelvorgang, Externe Vorgänge, Inaktiver Vorgang, Inaktiver Sammelvorgang, Nur Dauer, Manueller Sammelvorgang, Nur Ende, In Arbeit

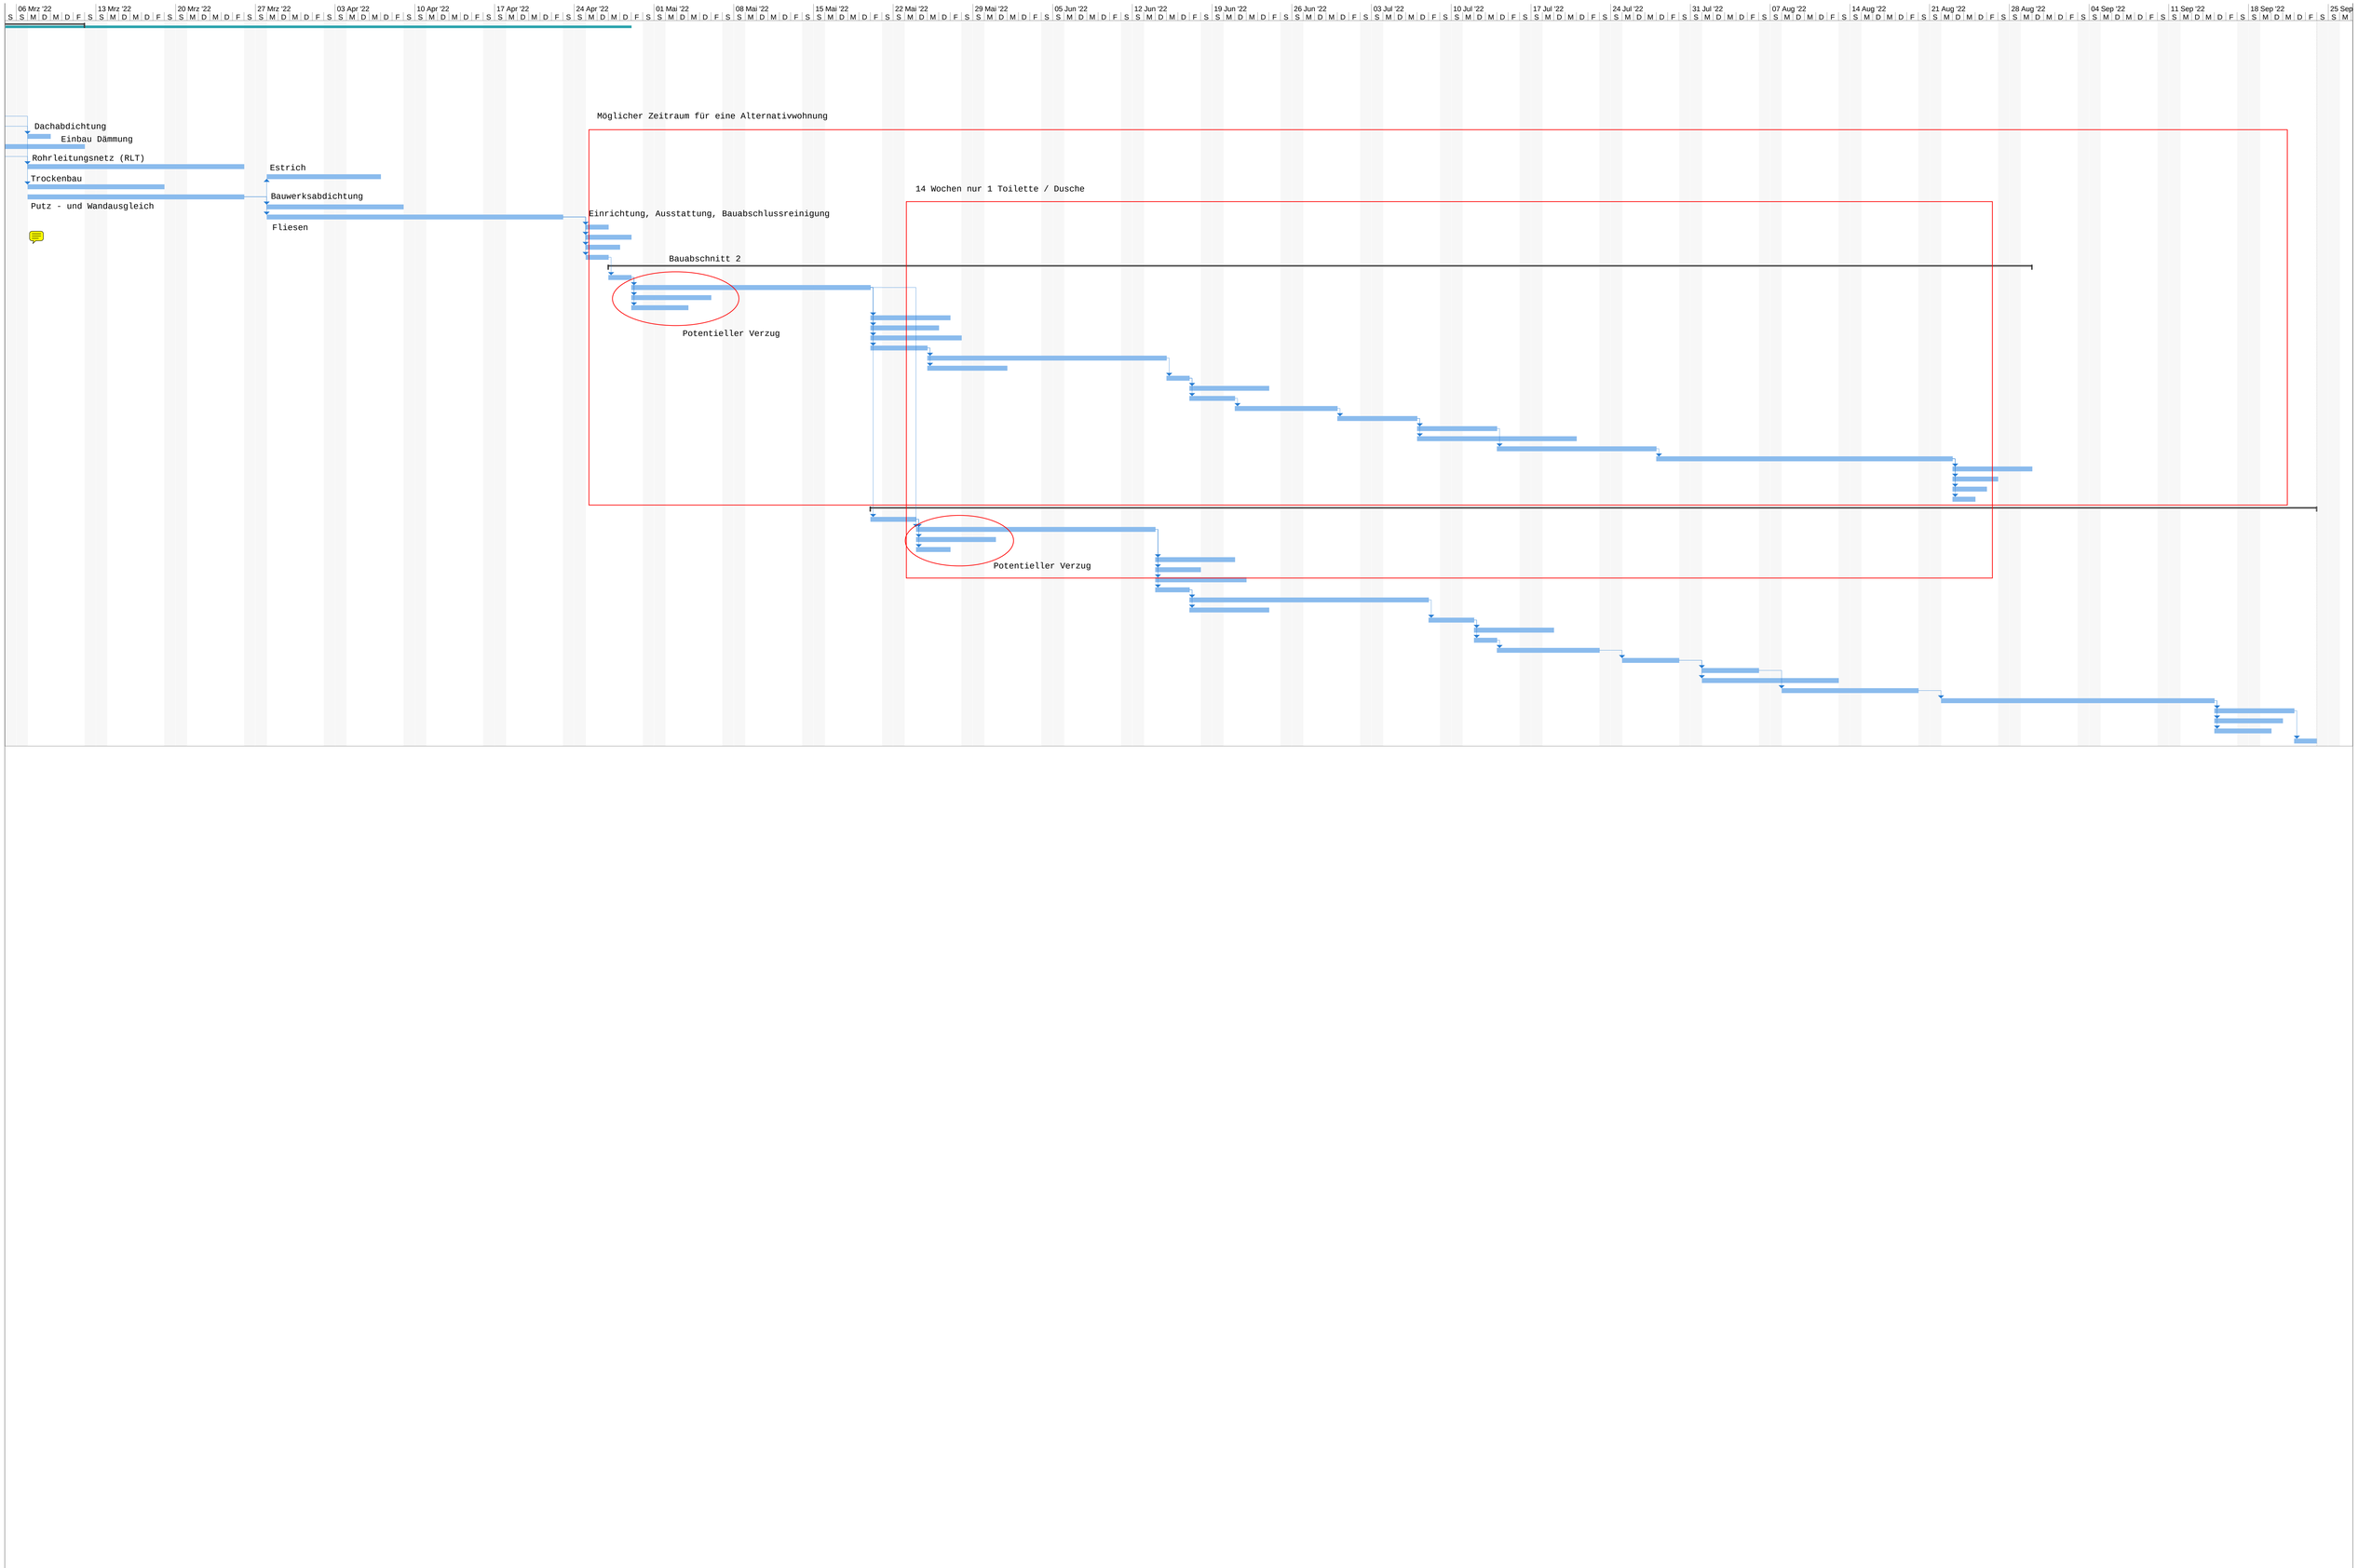

Projekt: msproj11
Datum: Fre 28.01.22

Vorgang | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein | Inaktiver Meilenstein | Manueller Vorgang | Manueller Sammelrollup | Nur Anfang | Stichtag | Manueller Fortschritt
Unterbrechung | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Sammelvorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelvorgang | Nur Ende | In Arbeit
